

# Raitiotieallianssin kokonaistilanne


Osa 1 Hervanta-keskusta-Tays, toteutusvaihe

Projekti-aika



18 %

Valmiusaste




12 %

Laskutus




12 %

Turvallisuus

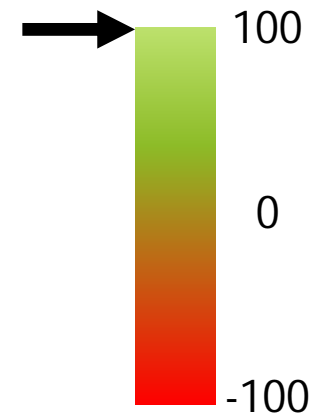


100



# Raitiotieallianssin tunnuslukuja

- Osan 1 tavoitekustannus: 230,0 M€.
- Osan 2 kustannusarvio: 44,1- 57,2 M€ (linjausvaihtoehdoista riippuen).
- Osalla 1:
  - Raitiotien kaksoisraidetta 15 km + 3 raidekilometriä varikkoraiteita
  - 24 raitiotiepysäkkiä ja 2 pysäkkivarausta
  - 10 sähkösyöttöasemaa
  - 8 uutta siltaa ja 8 muokattavaa siltaa
  - 20 tukimuuria
- Projektille on perehdytetty vuoden 2017 aikana noin 1500 henkilöä, joista ulkomaalaisia 30 henkilöä.
- Vuonna 2017 Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt n. 160 tiedotetta.
- Raitiotieallianssi.fi-sivujen työmaa- ja liikennejärjestelykarttaa katsottu yli 81 000 kertaa
- Suosituin some-päivitys tavoitti yli 120 000 henkilöä.
- Toteutusvaiheessa tehtyjä työtunteja on yli 300 000 tuntia eli noin 200 henkilötyövuotta.
- Raitiotieallianssilta on 123 yritystä laskuttanut yli 20 000 euroa. Kaikkien aliurakoitsijoiden laskutus on yli 11 M€, josta pirkanmaalaiset yritykset ovat laskuttaneet yli 8 M€
- Hankkeen henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 370 henkilöä
- Hankkeessa ei ole tapahtunut yhtään työtapaturmaa

è Rakennustyöt etenevät asetetun aikataulun ja tavoitekustannuksen mukaisesti





raitiotieallianssi.fi

